


Un quinto de la cartera minera 2025-2034 aún no ingresa al SEIA


21.894 MMUS\$ en 8 proyectos (20,9% de la inversión total)

Tiempo hasta aprobación	EIA grandes aprobados a 24 meses	En evaluación hoy	Inversión aprobada
DIA 7,7 meses (7,2-8,1) EIA 28,8 meses (23,7-32,9)	26,4-49,8% IC bootstrap estimación central 38,4%	24.780 MMUS\$ 15 proyectos	32.621 MMUS\$ 31,2% de la cartera

El capital sin expediente en estudio equivale a un quinto

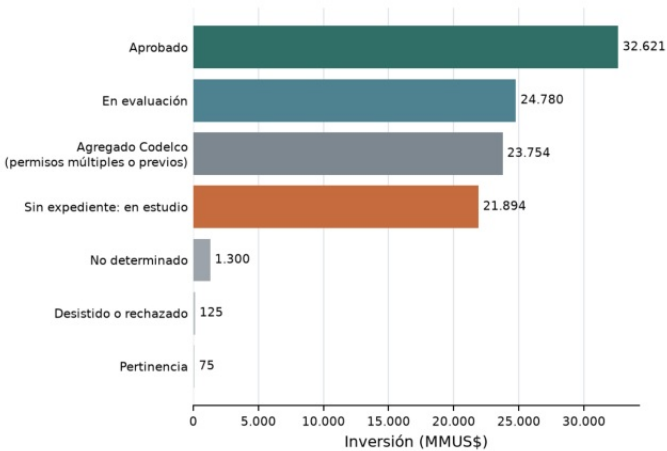

Los riesgos competitivos reducen la aprobación observada

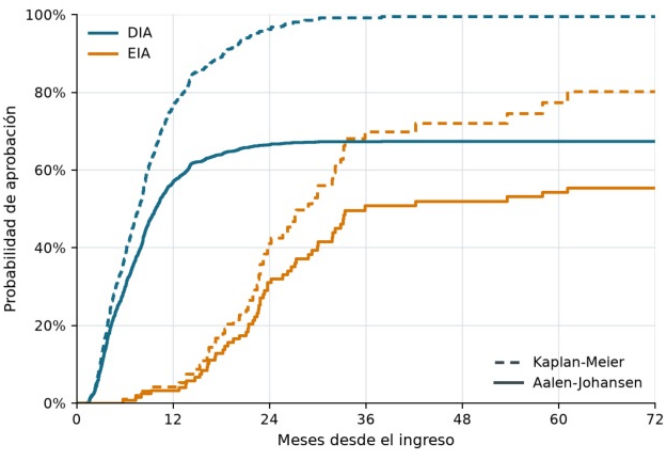

Brecha KM - Aalen-Johansen a 24 meses: DIA +29,7 pp | EIA +10,1 pp

Implicancias para contratistas

- La ventana de licitación de ~21.900 MMUS\$ depende de un permiso que aún no se pide. Con la mediana de un EIA, la RCA llega como mínimo ~2,4 años después del ingreso.
- Para EIA grandes, solo entre 1 de cada 4 y 1 de cada 2 está aprobado a 24 meses: planificar con ese rango, no con las fechas de puesta en marcha de Cochilco.
- La judicialización agrega riesgo de plazo: existen rechazos seguidos de aprobación por reclamación y RCA anuladas por un tribunal ambiental.

Método y alcance

Fuentes: Cochilco, Anexo C (dic-2025), y SEA (corte 30-09-2026).
Población: 1.645 expedientes mineros admitidos. Kaplan-Meier y Aalen-Johansen.
Unidad: expediente principal; las modificaciones no cuentan como cruce.
Cruce de 59 proyectos validado manualmente; cada cifra tiene recálculo independiente.
Una clasificación ingenua indicaba 64% sin permiso; tras corregir proyectos en ejecución, filiales operativas y filas agregadas, la cifra es 21%.
