


16,3% de la inversión minera 2025–2034 está en proyectos en estudio sin expediente SEIA identificado


17.043 MMUS\$ en 7 proyectos, todos en etapa de estudio · corte SEA 25-08-2026

Aprobación acumulada de EIA	EIA ≥100 MMUS\$ aprobados a 24 meses	En calificación al corte SEA	Con RCA favorable
31,7% a 24 meses · n=124 51,7% a 36 meses 50% a ~33 meses	39,6% (IC95% 27,6–52,0) · n=81	24.780 MMUS\$ · 15 proyectos	37.597 MMUS\$ · 36,0% de la cartera

Cartera 2025–2034 por estado SEIA (MMUS\$)

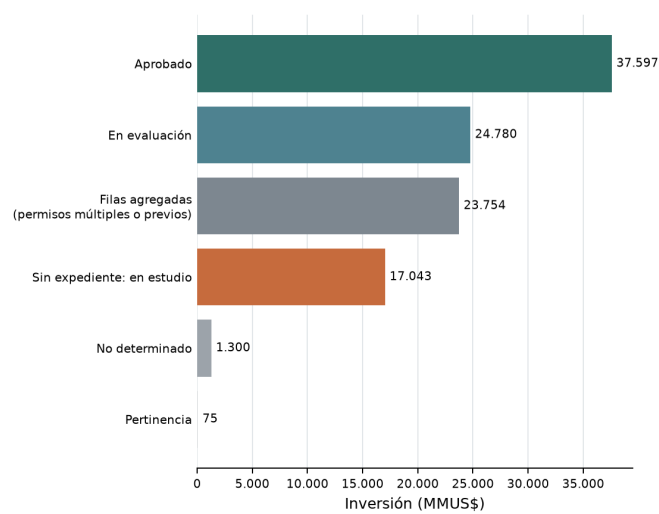

Ignorar desistimientos, rechazos y términos anticipados (Kaplan–Meier) sobrestima la aprobación

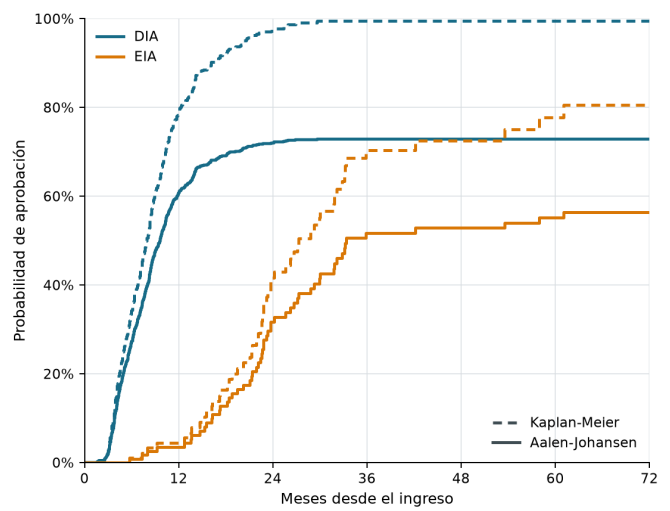

Implicancias para contratistas

- Al corte, estos ~17.000 MMUS\$ no registran ingreso al SEIA. Si requieren EIA, a 24 meses de su ingreso solo 31,7% de los EIA mineros está aprobado.
- Para EIA ≥100 MMUS\$ estimamos 39,6% aprobado a 24 meses (IC95% 27,6–52,0%): conviene planificar con holgura de permisos sobre las fechas de puesta en marcha de Cochilco.
- Aparte, 4 filas agregadas en ejecución (23.754 MMUS\$) agrupan varios proyectos con permisos múltiples o previos; no se asignan a un expediente único ni se incluyen en la cifra principal.

Método y alcance

Fuentes: Cochilco, Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025–2034 (Anexo C, dic-2025). SEA: descarga 30-09-2026, último registro 25-08-2026. Población: 995 expedientes mineros admitidos, ingresados entre 2011 y 2026; excluye áridos. Kaplan–Meier y Aalen–Johansen; meses = días/30,44. Cartera: expediente principal por proyecto; las modificaciones no cuentan como cruce. Tiempos: cada expediente, incluidos reingresos. Los 59 proyectos se revisaron uno a uno contra el SEA. Sensibilidad del titular: 8,6% si se excluye el proyecto dudoso de mayor monto; 40,3% si se suman las filas agregadas y el caso no determinado. Con RCA favorable incluye 1 proyecto (4.851 MMUS\$) cuya RCA vigente tiene una actualización en calificación. Las cifras se reproducen con el código y los datos del repositorio, y se verifican con tests automáticos.
