


20,9% de la inversión minera 2025–2034 no tiene expediente SEIA identificado


21.894 MMUS\$ en 8 proyectos, todos en etapa de estudio · corte SEA 25-08-2026

Aprobación acumulada de EIA	EIA ≥100 MMUS\$ aprobados a 24 meses	En calificación al corte SEA	Con RCA favorable
31,7% a 24 meses · 51,7% a 36 meses · 50% a ~33 meses	39,6% (IC95% 27,6–52,0) · n=81	24.780 MMUS\$ · 15 proyectos	32.746 MMUS\$ · 31,3% de la cartera

Proyectos en estudio sin expediente identificado: 20,9% de la inversión

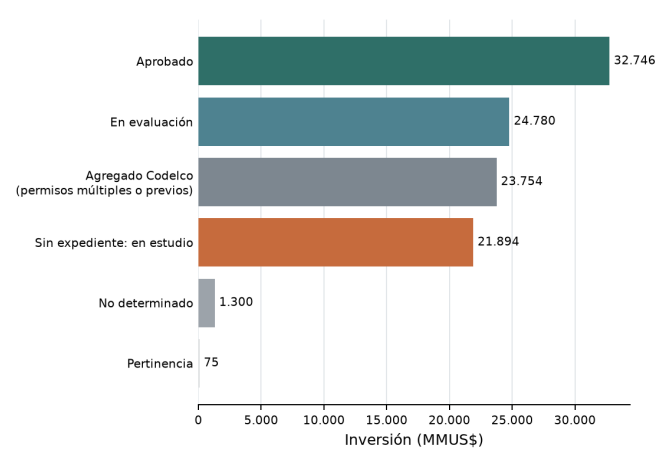

Ignorar desistimientos y rechazos (Kaplan–Meier) sobrestima la aprobación

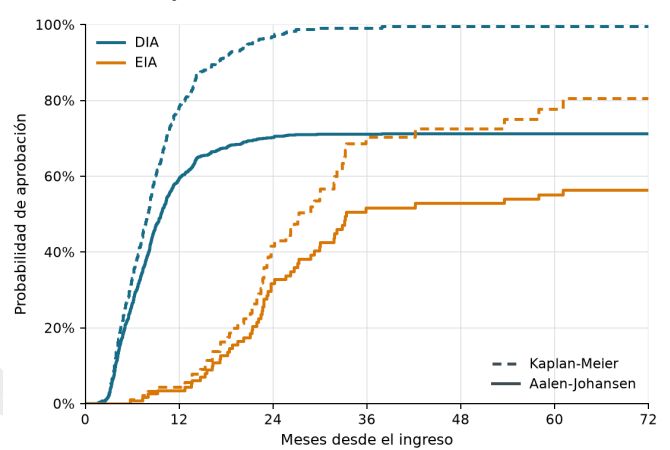

Implicancias para contratistas

- Estos ~21.900 MMUS\$ aún deben ingresar al SEIA antes de construir. A 24 meses de su ingreso, 31,7% de los EIA está aprobado.
- Para EIA ≥100 MMUS\$ estimamos 39,6% aprobado a 24 meses (IC95% 27,6–52,0%): conviene planificar con holgura de permisos sobre las fechas de puesta en marcha de Cochilco.
- La cifra puede ser mayor: 4 filas agregadas de Codelco (23.754 MMUS\$) no permiten asignar un expediente único.

Método y alcance

Fuentes: Cochilco, Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025–2034 (Anexo C, dic-2025). SEA: descarga 30-09-2026, último registro 25-08-2026. Población: 1.126 expedientes mineros admitidos, ingresados entre 2011 y 2026; excluye áridos. Kaplan–Meier y Aalen–Johansen; meses = días/30,44. Cartera: expediente principal por proyecto; las modificaciones no cuentan como cruce. Tiempos: cada expediente, incluidos reingresos. 38 de 59 cruces revisados ficha por ficha. Sensibilidad del titular: 8,6%–44,9% según 2 clasificaciones y las filas agregadas. Cifras recalculadas por un script independiente; código y datos en el repositorio.
